

UNISENAI
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Moreira
Douglas do Carmo
Jamil Cherem

SMARTRENT B2B — CRONOGRAMA


Planejamento macro do MVP em 30 dias corridos, alinhado à matriz MoSCoW

Florianópolis
2026

1 VISÃO GERAL

O escopo do SmartRent B2B foi delimitado para caber em 30 dias corridos. Qualquer demanda fora desse prazo, como aplicativos móveis nativos, um gateway de pagamento real ou a sincronização bidirecional de reservas via iCal com plataformas externas, é registrada como Visão Futura e não integra este cronograma.

Figura 1 – cronograma macro do MVP

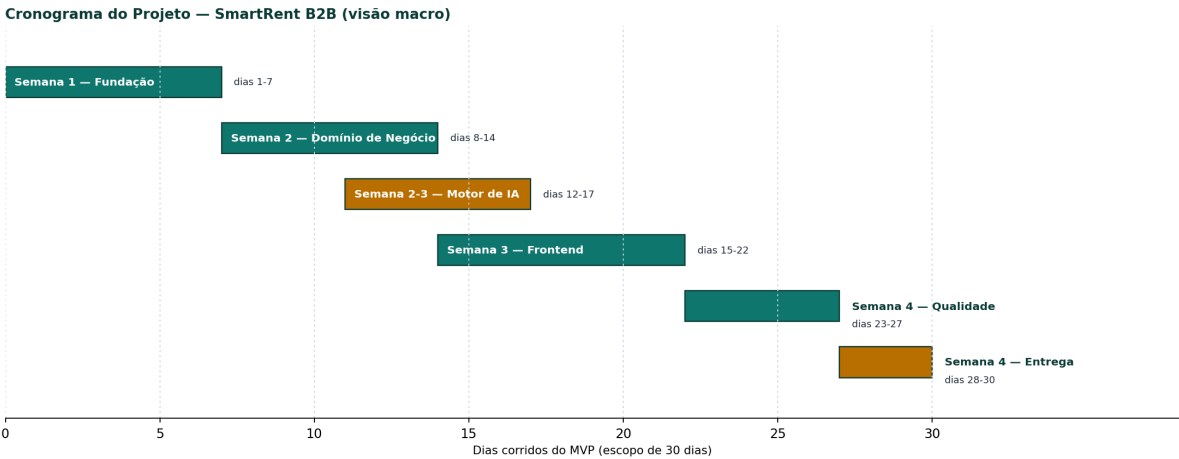

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2 DETALHAMENTO POR FASE

Quadro 1 – Detalhamento das fases do cronograma

Fase	Período	Entregas	Situação
Semana 1 — Fundação	Dias 1 a 7	Inicialização do projeto Maven e Spring Boot, modelagem das entidades JPA (Usuario, Imovel, Reserva, SugestaoPreco), repositórios com a verificação de conflito de datas, geração e validação do esquema por migration contra um PostgreSQL real.	Concluída
Semana 2 — Domínio de negócio	Dias 8 a 14	Objetos de transferência de dados (Records), camada de serviço com a checagem de conflito dentro de transações, controladores REST e tratamento centralizado de exceções.	Planejada
Semanas 2-3 — Motor de IA	Dias 12 a 17	Integração com a Groq API (Llama 3.3) por meio do cliente HTTP nativo do Spring, implementação e testes do cálculo de contingência, registro auditável da origem de cada sugestão de preço.	Planejada
Semana 3 — Interface	Dias 15 a 22	Telas de gestão de imóveis, gestão de reservas, precificação inteligente e painel executivo, em HTML5, Tailwind CSS e Chart.js.	Planejada
Semana 4 — Qualidade	Dias 23 a 27	Testes unitários com JUnit 5 e Mockito, esteira de integração contínua e implantação em Render (backend) e Vercel (frontend).	Planejada
Semana 4 — Entrega	Dias 28 a 30	Consolidação do relatório final, revisão da documentação de gestão e ensaio da apresentação à banca.	Planejada

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A Semana 1 já foi concluída e validada de ponta a ponta: build do Maven, esquema aplicado por migration e testado contra uma instância PostgreSQL real, incluindo um teste de idempotência (nova execução da migration sem erro). O detalhamento técnico dessa etapa está registrado em STATUS_PROJETO.md e na ADR-002, no repositório do projeto.
